



GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

Apresentado por: Lucas Veríssimo



Informações técnicas disponíveis
no Guia PMBOK.

Temas

1. Conceito das aquisições
2. Finalidade das aquisições
3. Aplicabilidade das aquisições
4. Planejar | Gerenciamento das aquisições
5. Conduzir as aquisições
6. Controlar as aquisições
7. Encerrar | Gerenciamento das aquisições



Visão geral do gerenciamento das aquisições do projeto

1. Entradas
2. Ferramentas técnicas
3. Saídas



Conceito das aquisições

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o comprador quanto o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto.



Voo Alaska Airlines 261

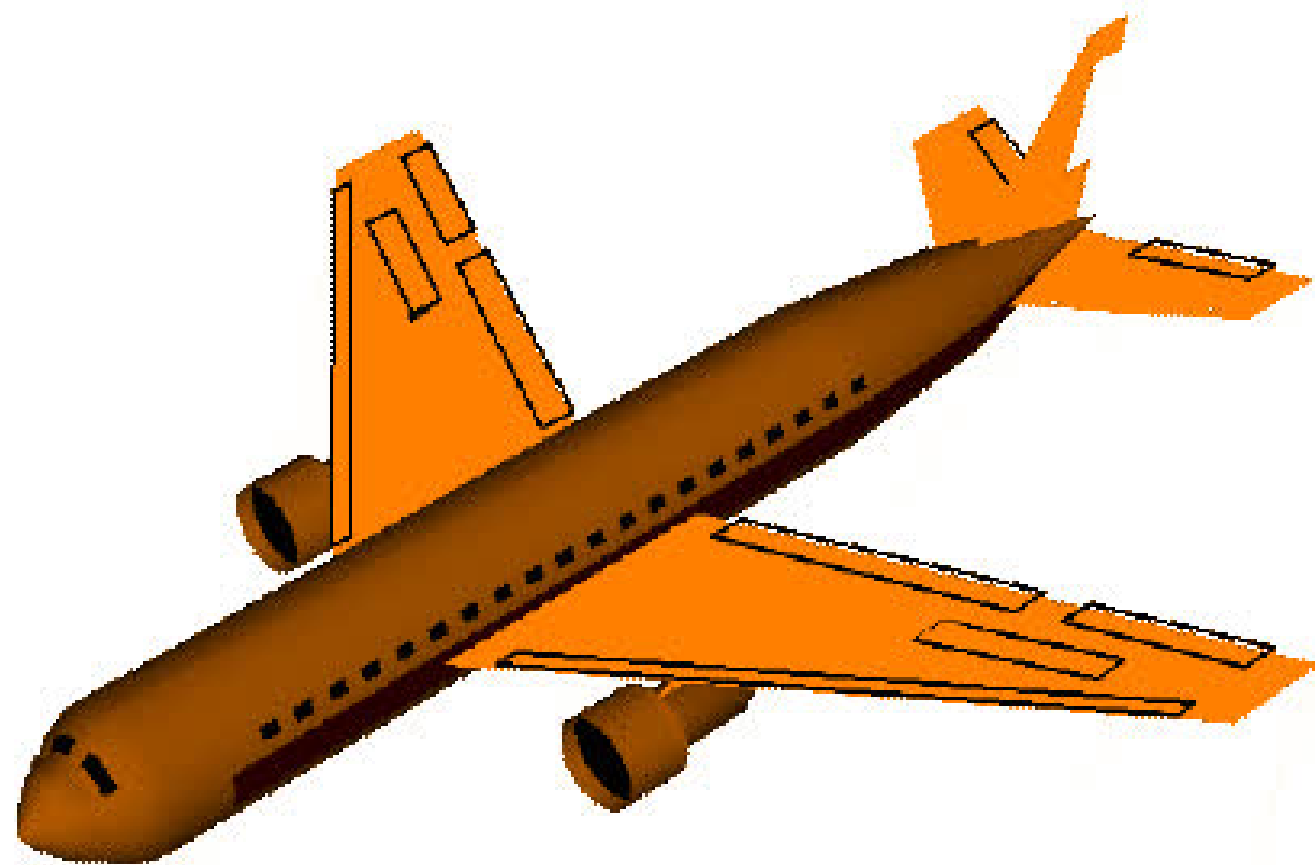


Fig. 1: estabilizador vertical é leme de direção.

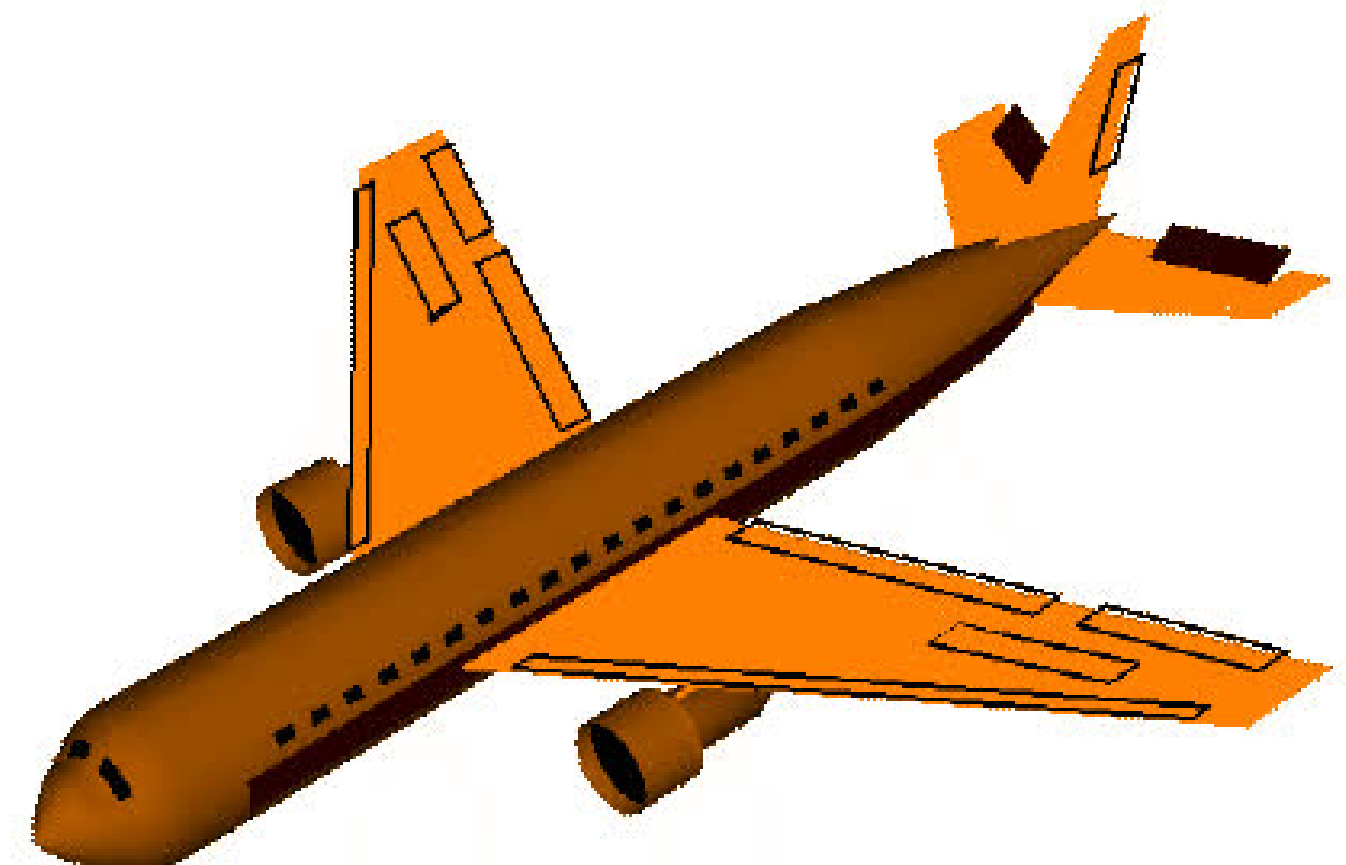


Fig. 2: estabilizador horizontal é leme de profundidade.


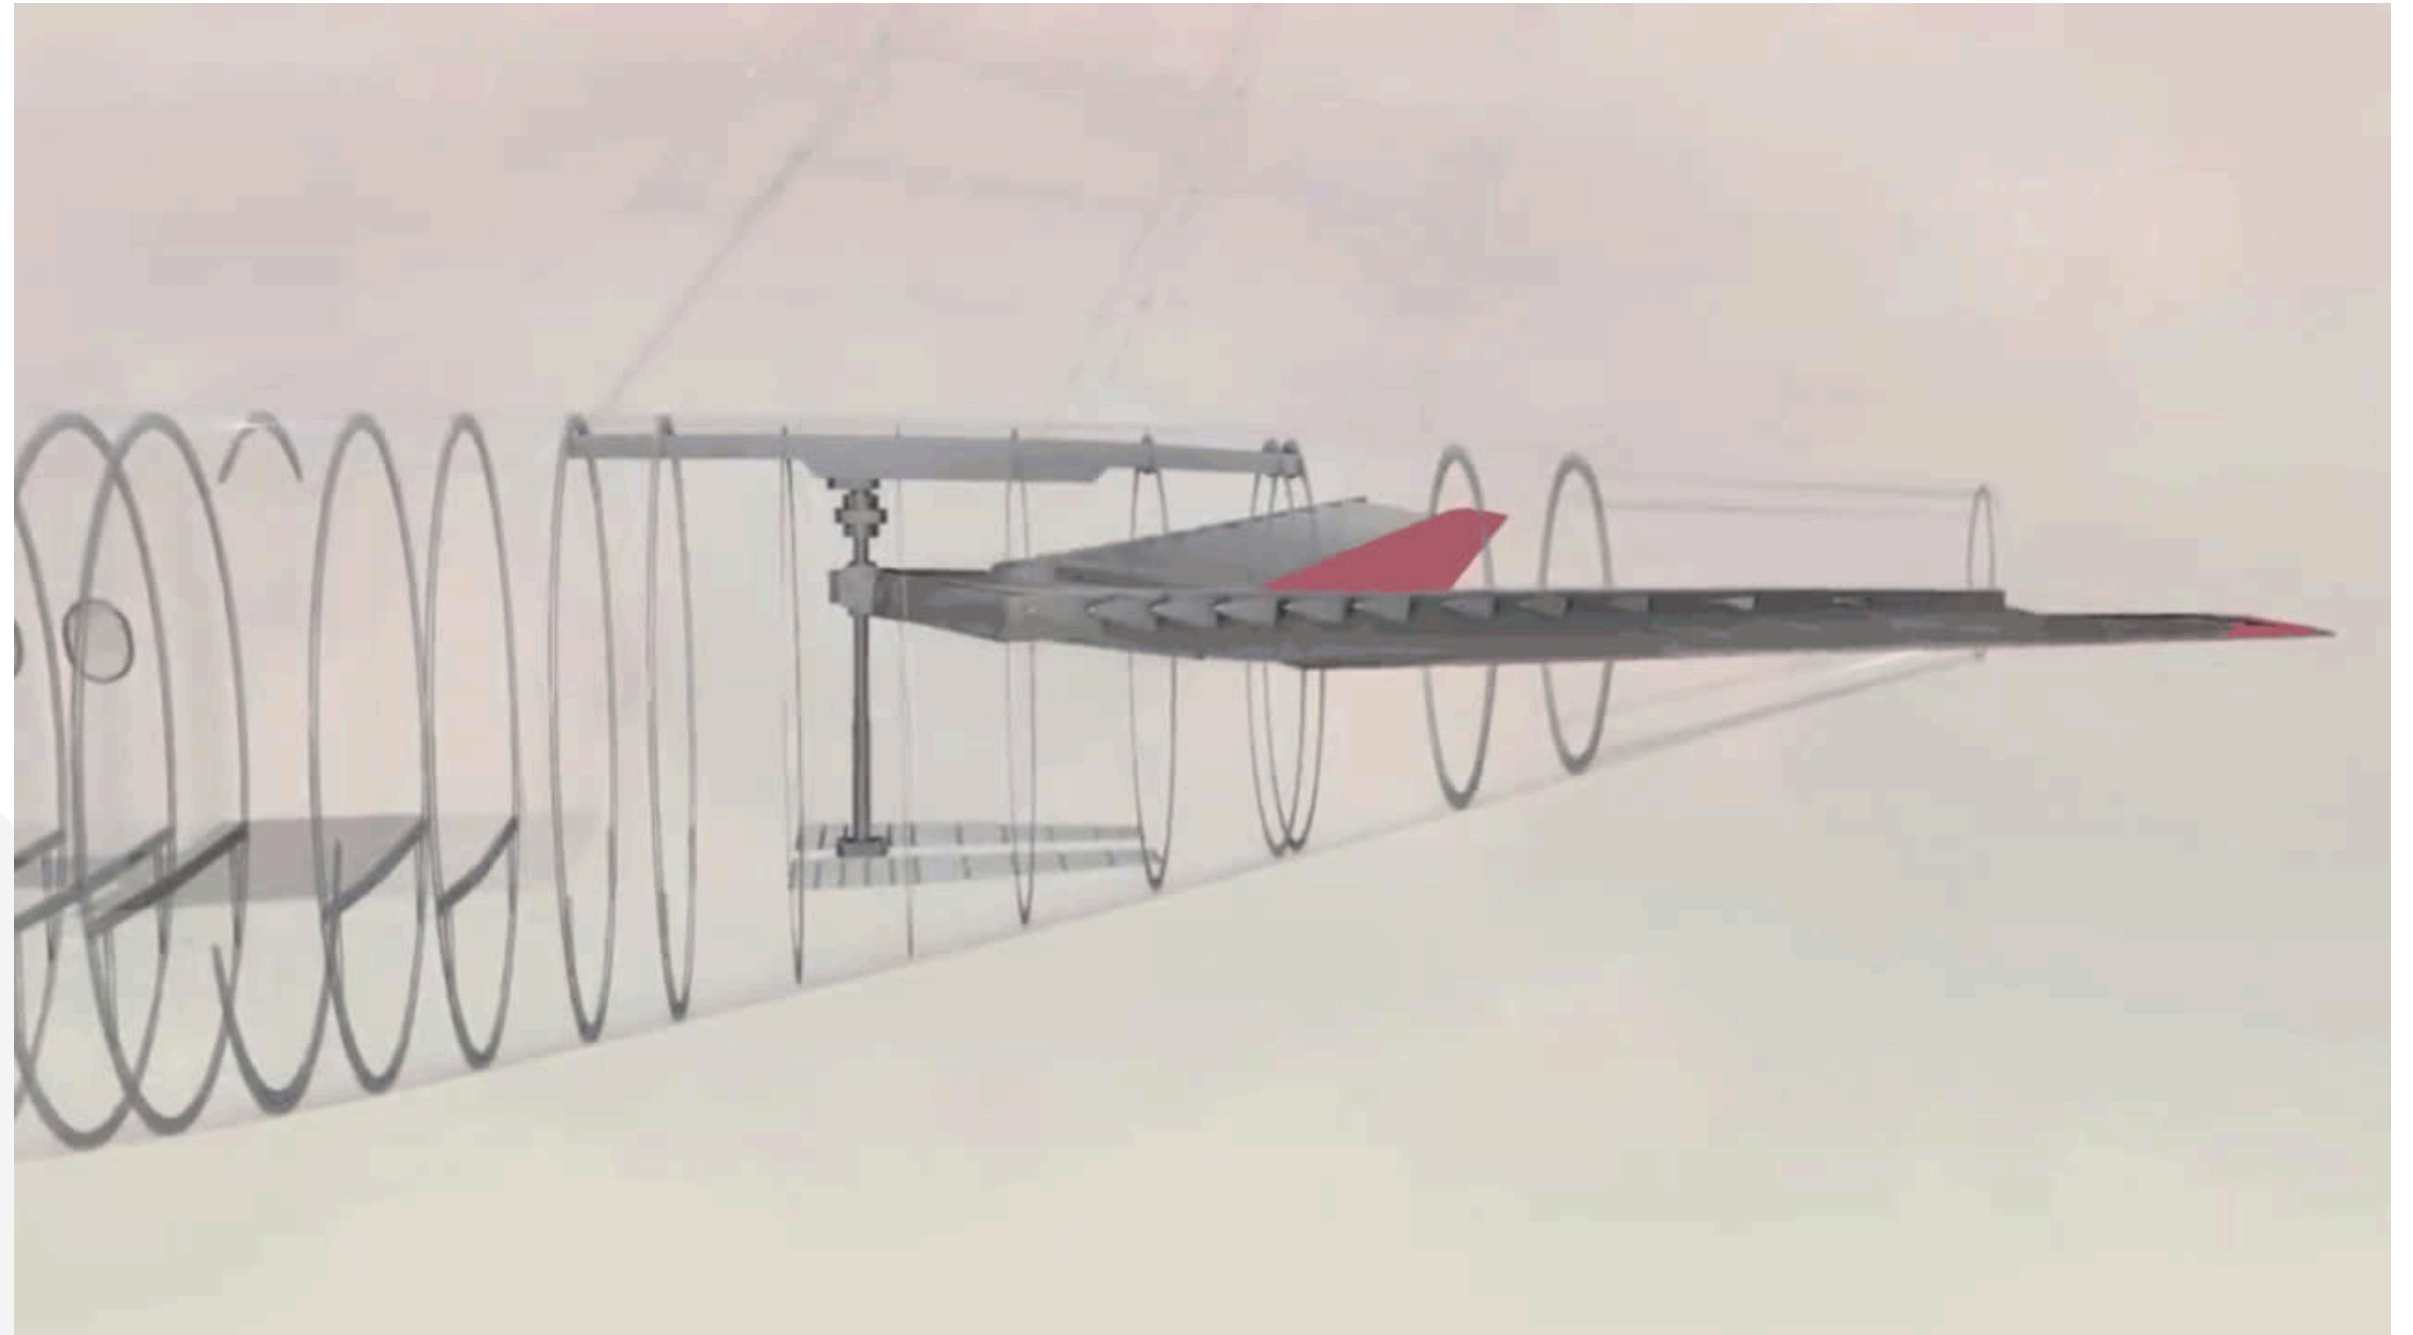


Fig. 3: parte da estrutura interna de um estabilizador horizontal.



Finalidade das aquisições

O gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos de gerenciamento de contratos e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto.

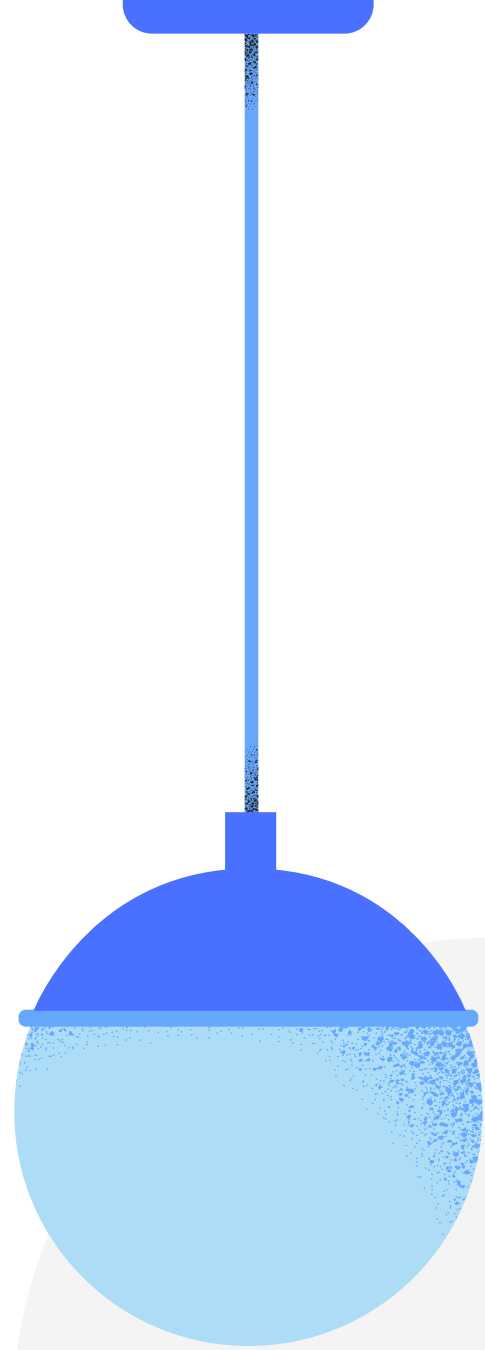




Aplicabilidade das aquisições



Pouco mais de uma dezena de empresas se dividem nas 62 marcas de automóveis mais conhecidas do mundo.

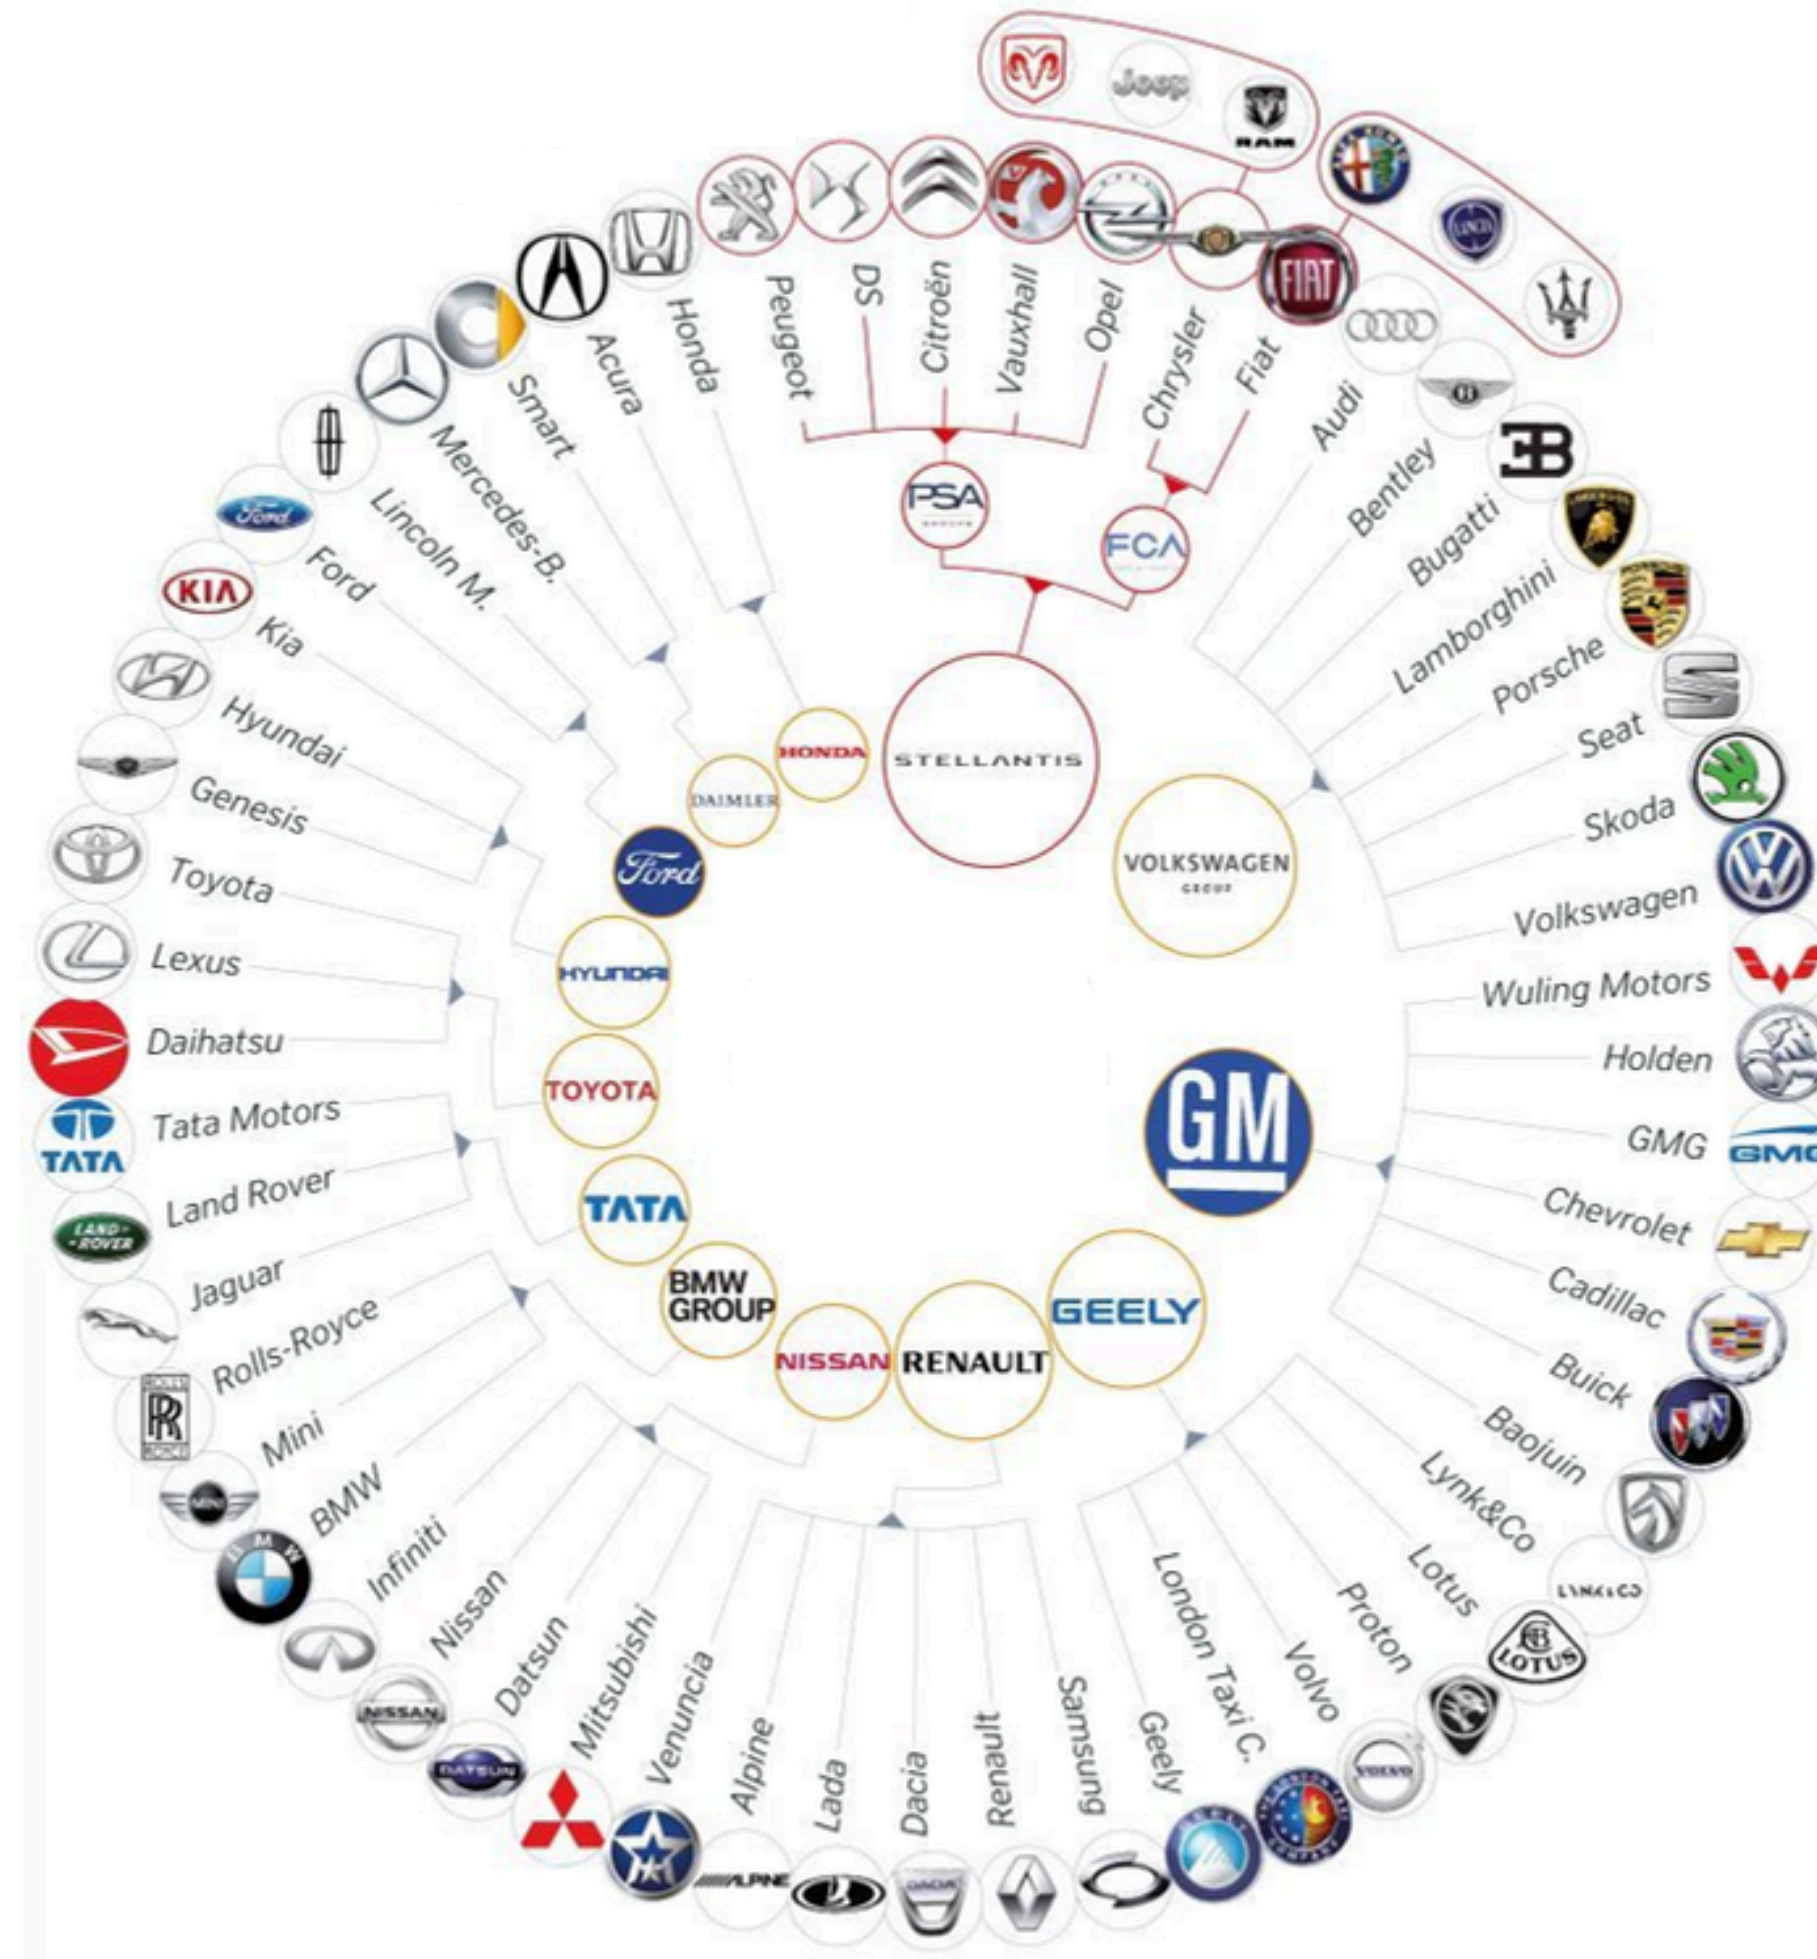



Planejar

Gerenciamento das Aquisições

É o processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial.

O principal benefício é que ele determina se deve adquirir ou não apoio externo e, se for o caso, o que adquirir, como fazer, a quantidade necessária, e quando efetuar a aquisição.

PÁGINA 358 A 370



Em meados dos anos 60, Alemanha, França e Reino Unido se juntam para brigar no mercado da aviação contra a hegemonia norte-americana.

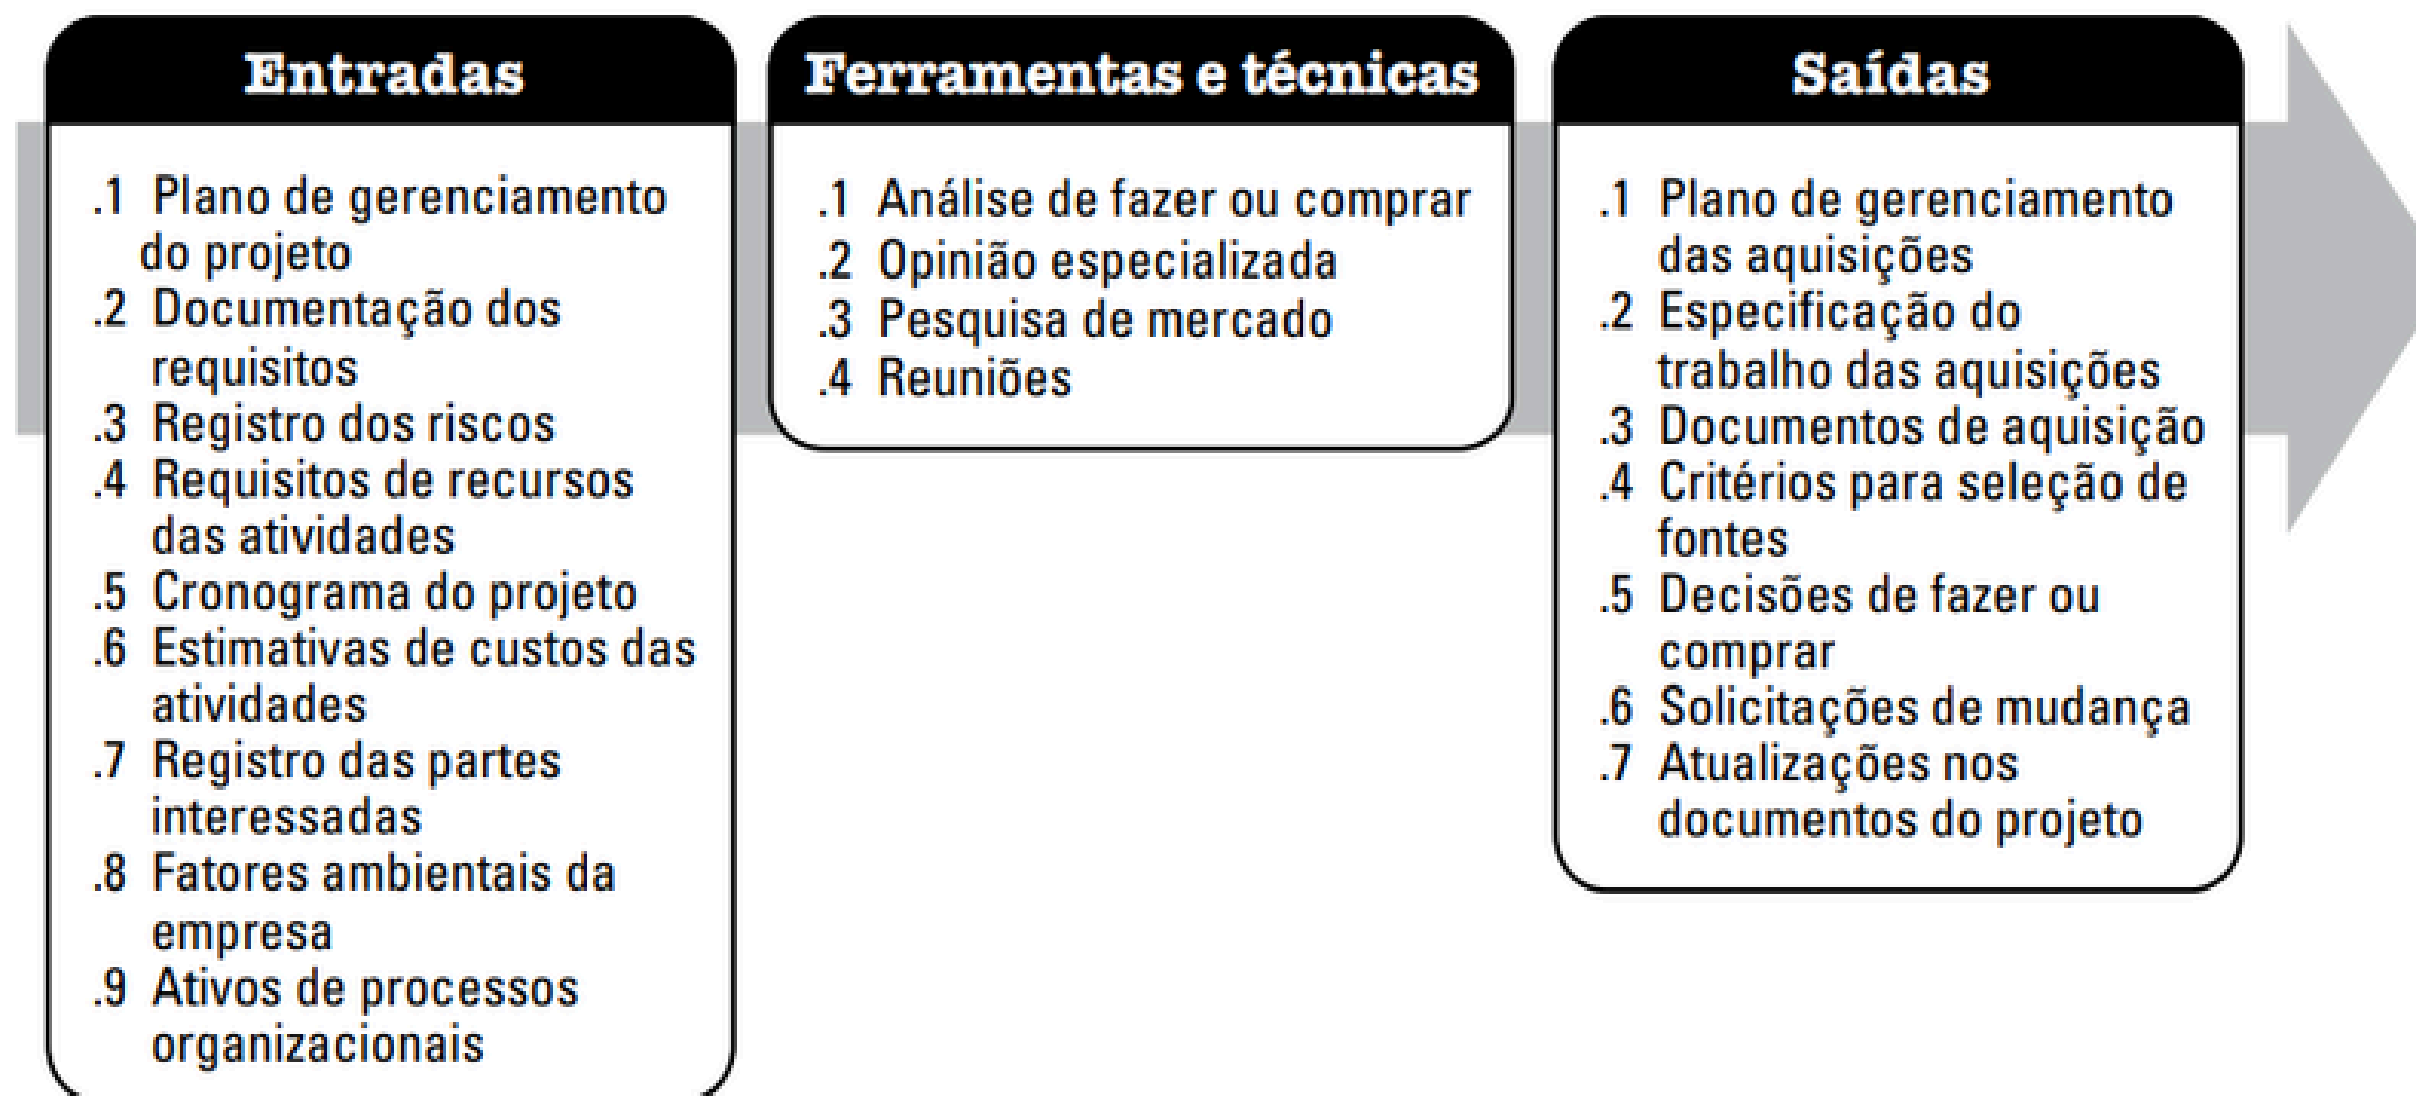



Fig. 4: planejar o gerenciamento das aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas.




McDonald's



- Richard e Maurice McDonald.

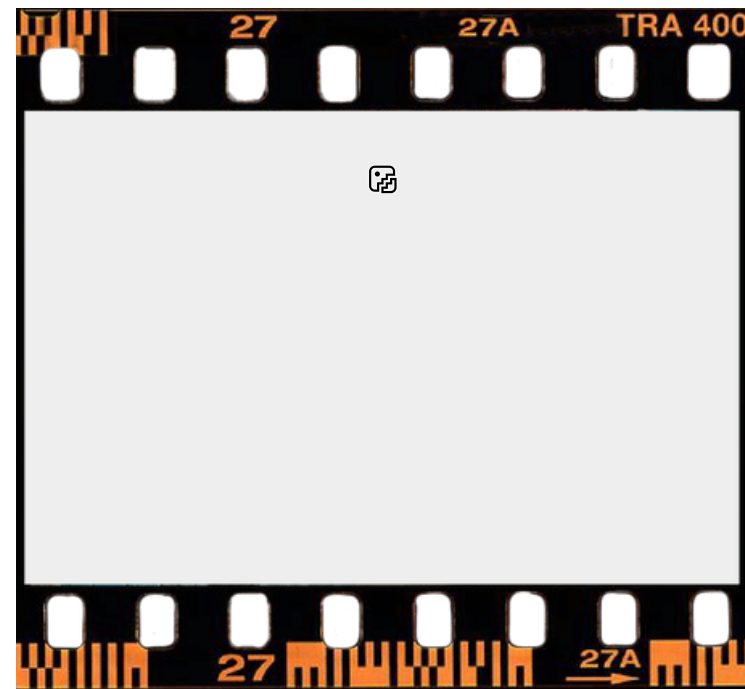

- Ray Croc & Franquias.

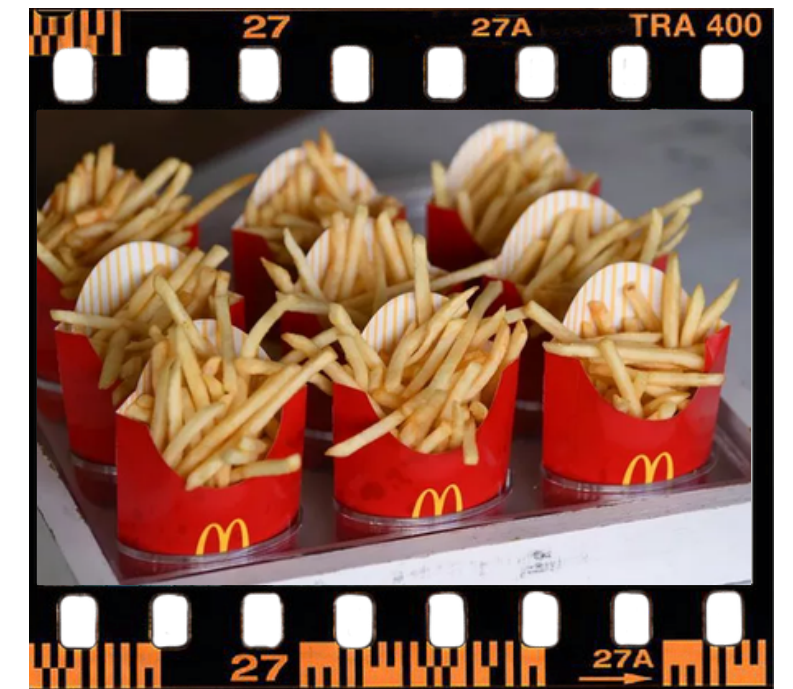

- Agricultura Industrial.

Conduzir as aquisições



É o processo de obtenção de respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor e aprovação de um contrato. O principal benefício desse processo é prover o alinhamento das expectativas internas e externas das partes interessadas através de acordos estabelecidos.

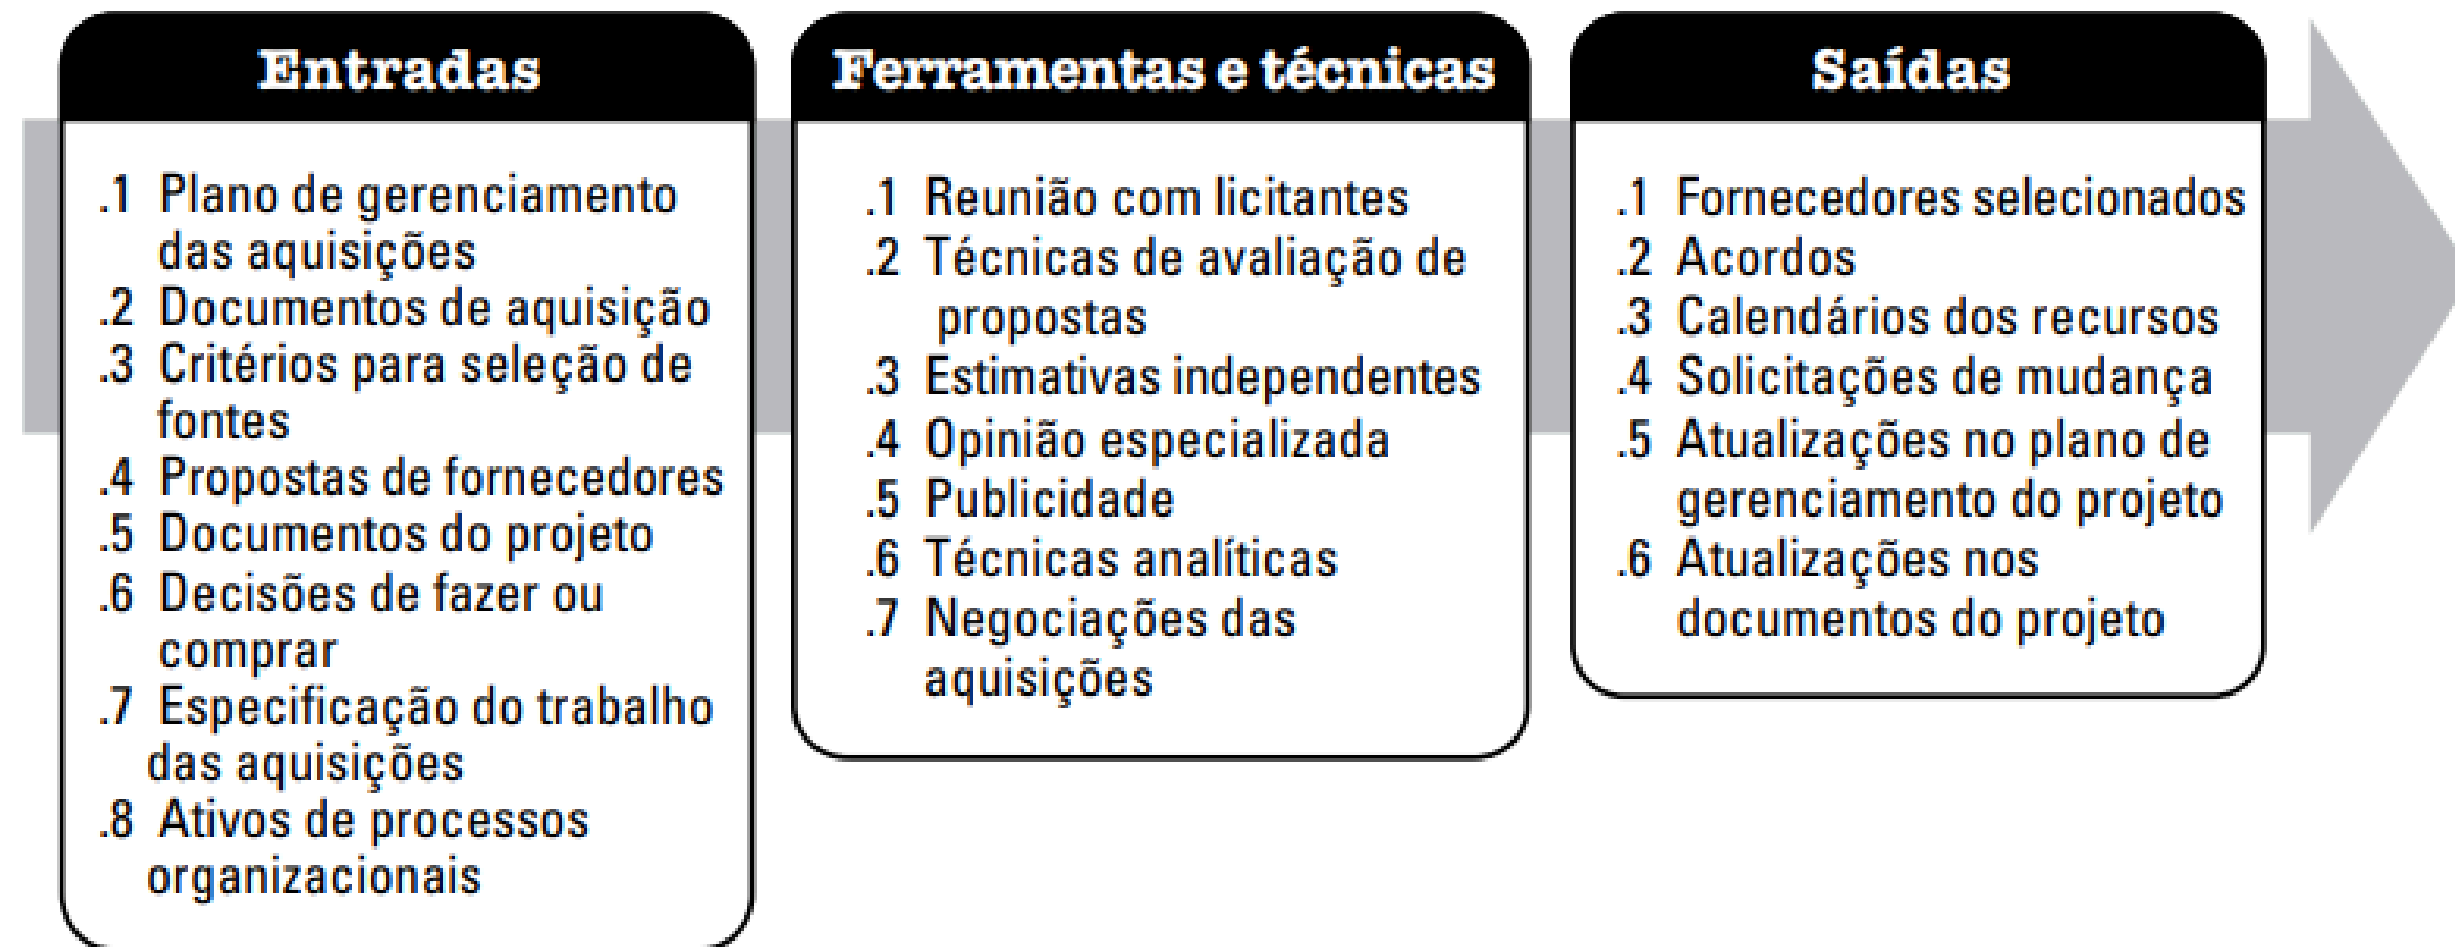


Fig. 5: conduzir as aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas.

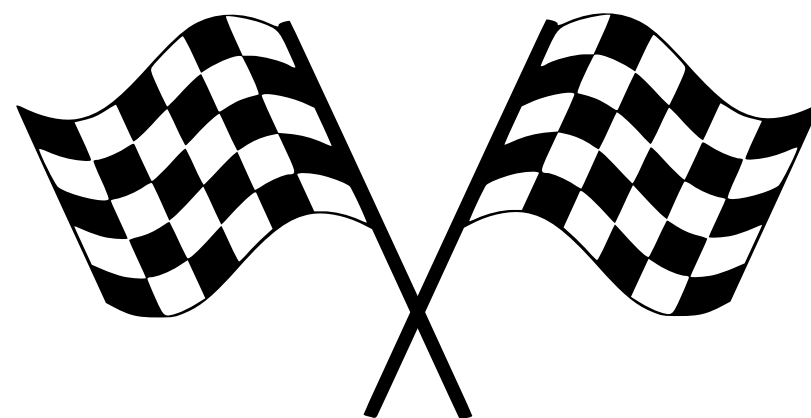


Fig. 6: a esquerda o **Ford GT40** e a direita o **Ferrari 412P**.



Controlar as aquisições

É o processo de gerenciamento das relações de aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudanças e correções nos contratos, conforme necessário. O principal benefício desse processo é a garantia de que o desempenho tanto do fornecedor quanto do comprador cumprem os requisitos de aquisição, de acordo com os termos do acordo legal.




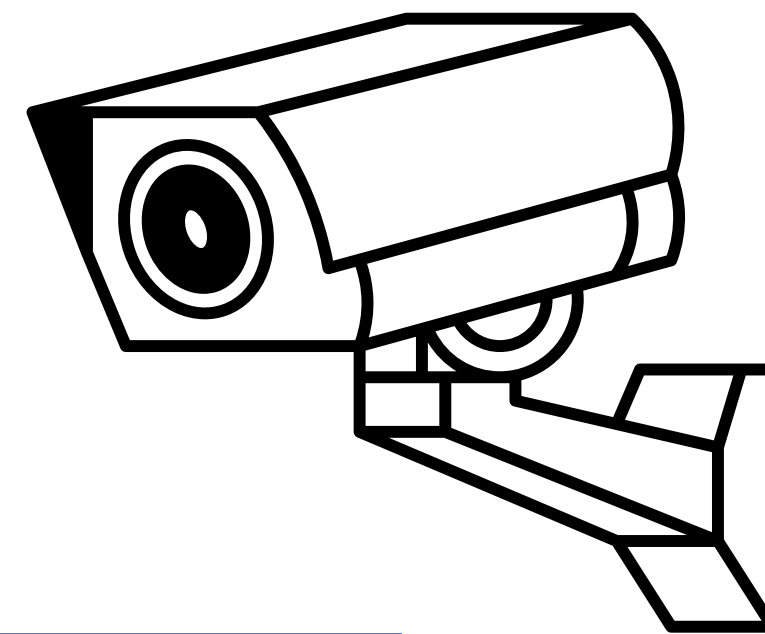




Fig. 7: controlar as aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas.

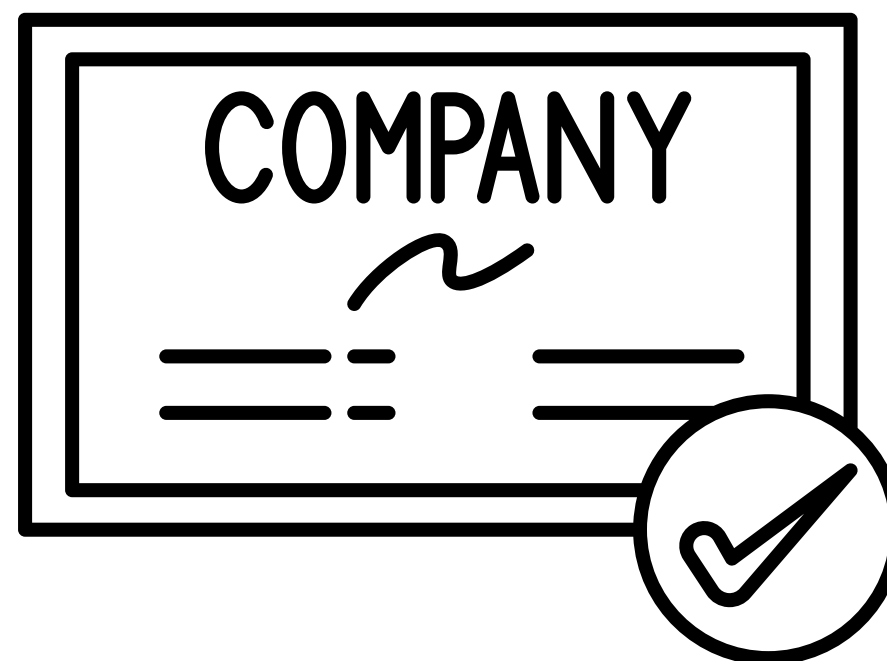

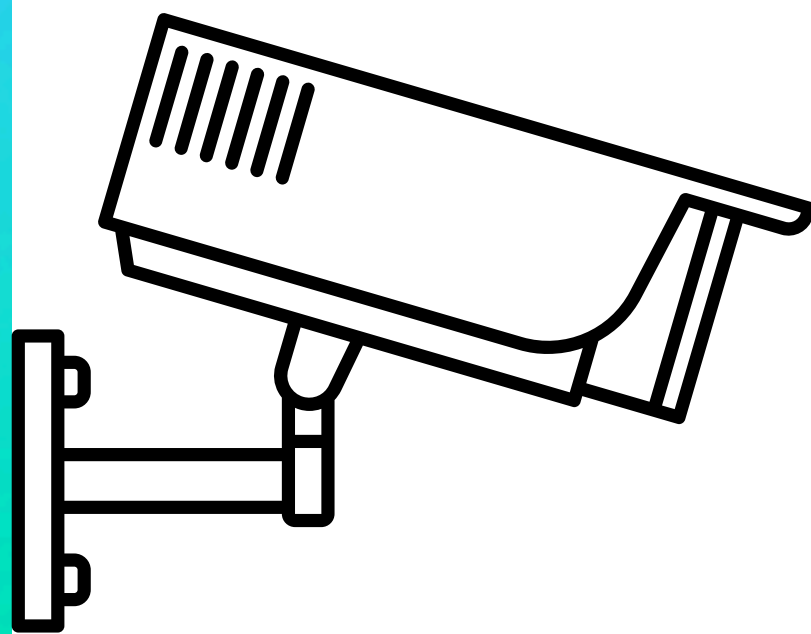

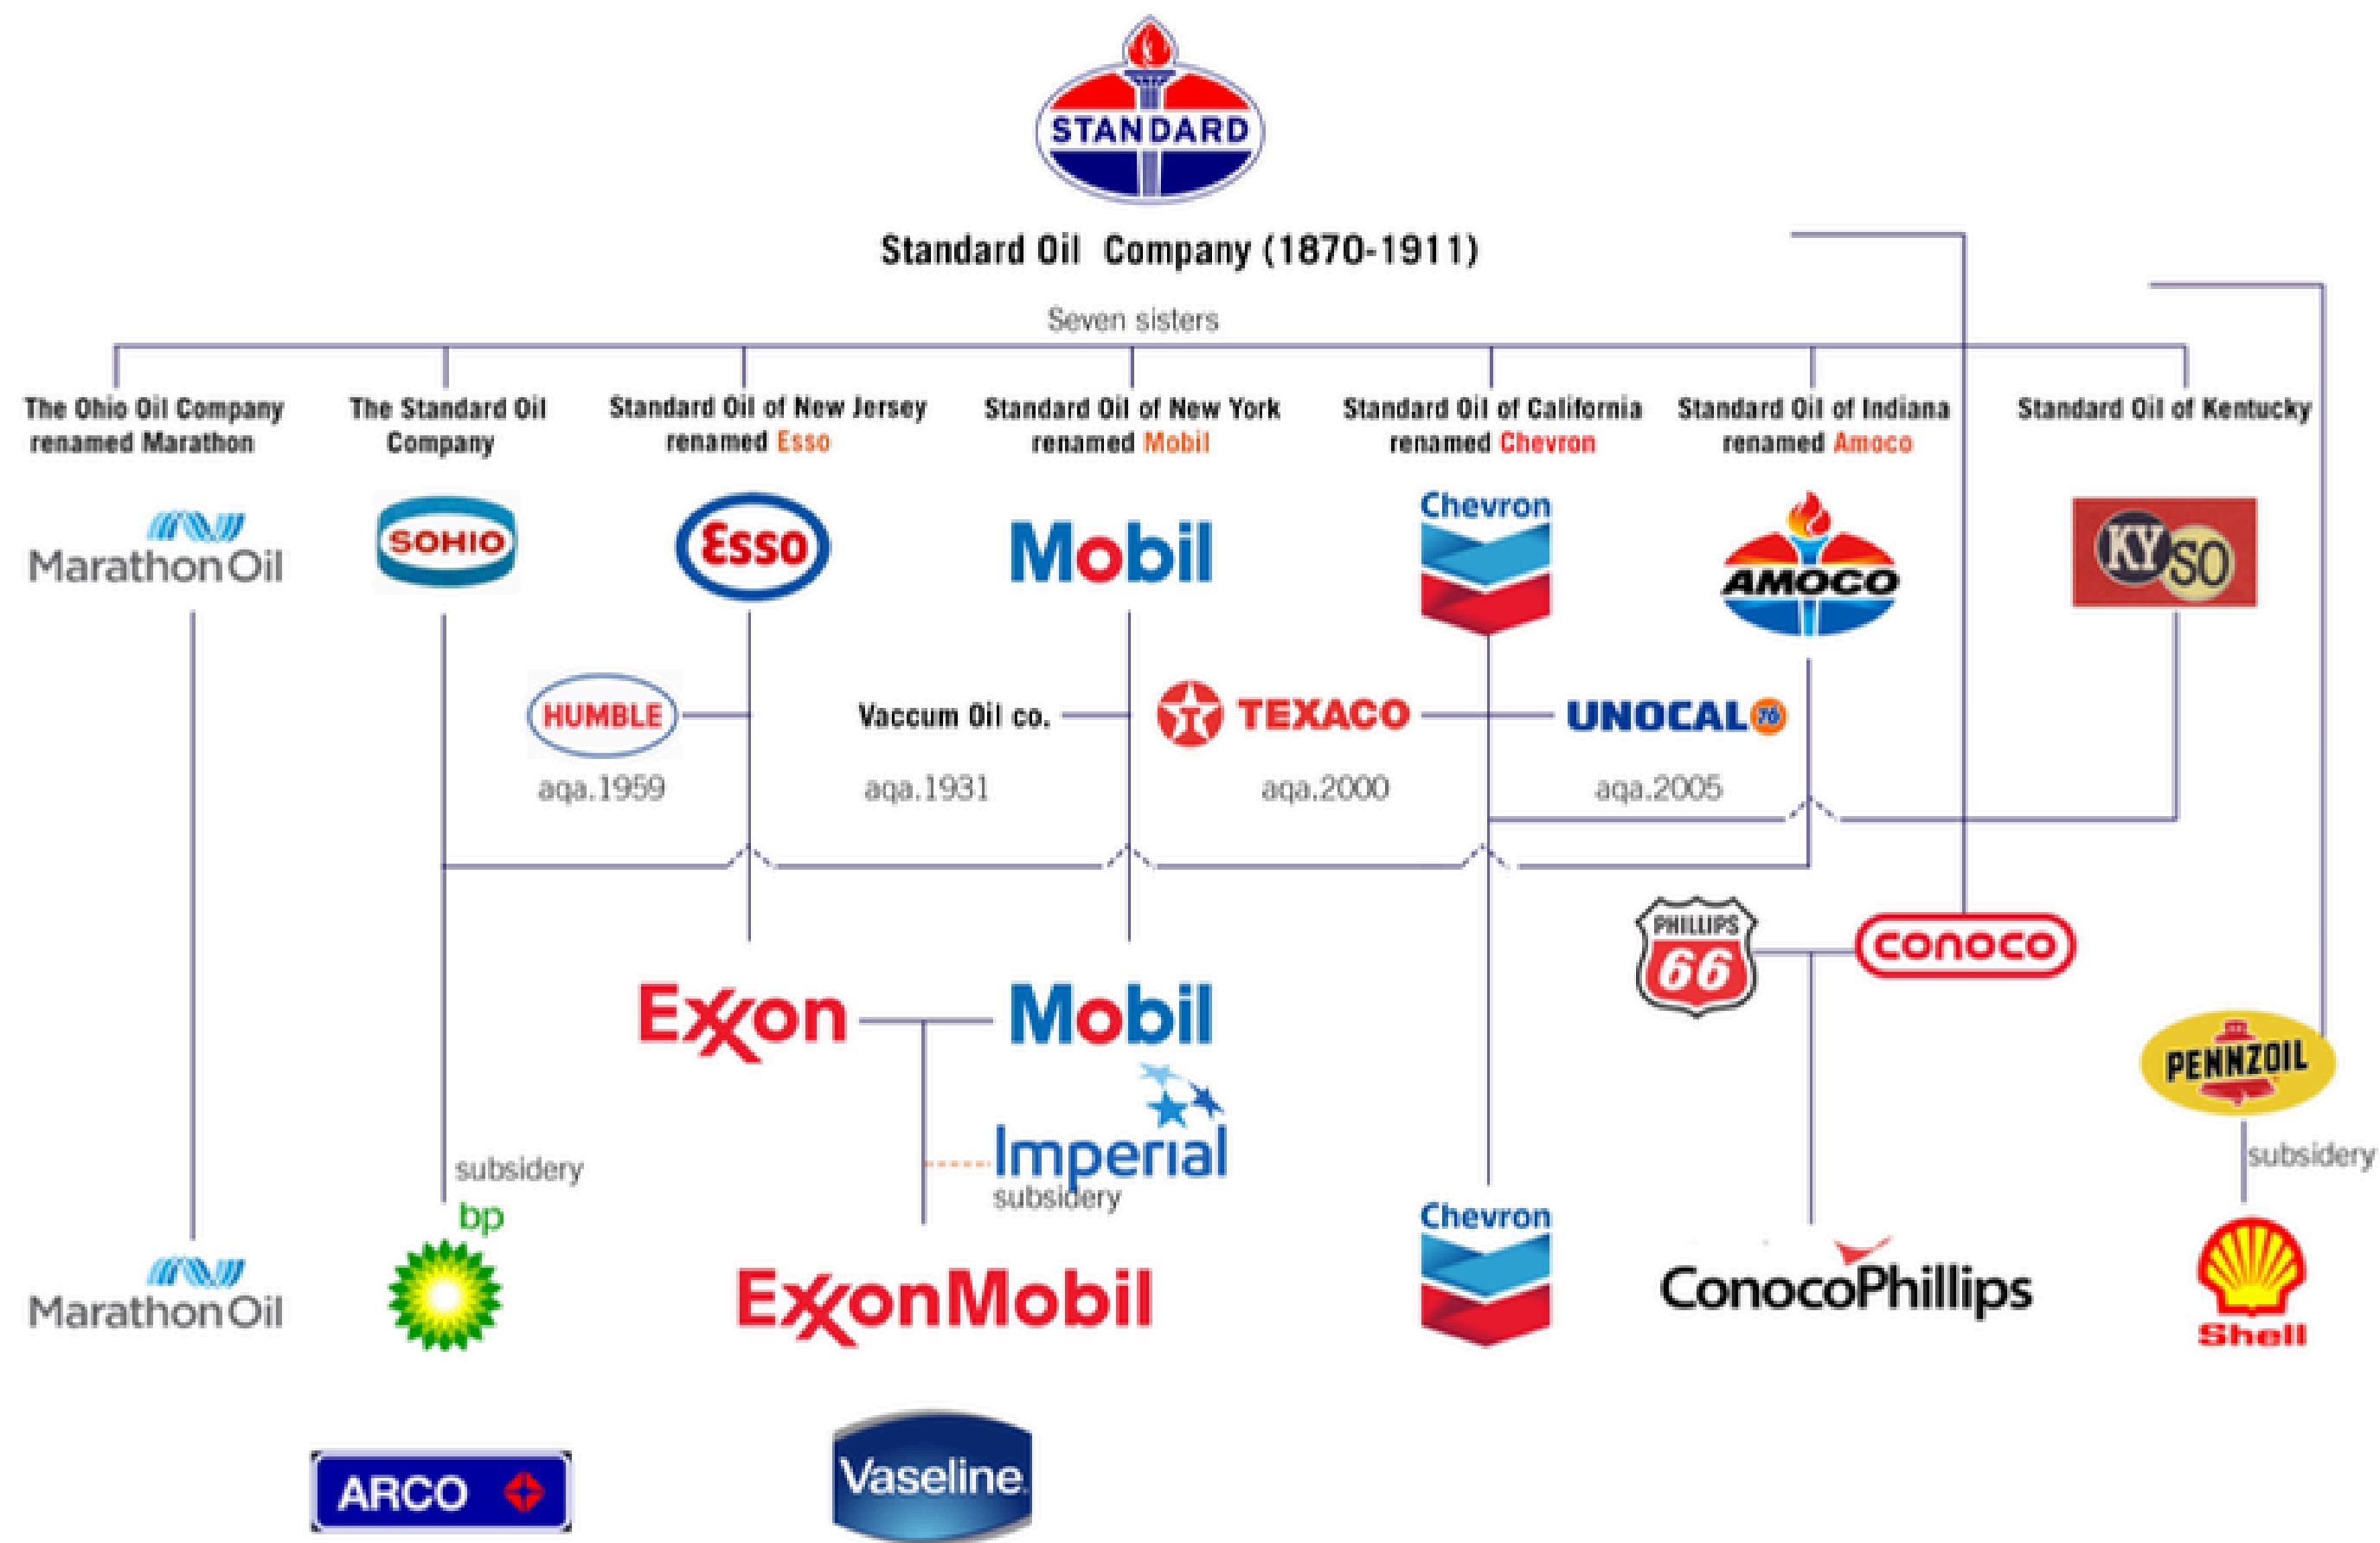

Henri Ziegler, costura um acordo entre Hawker e Nord para construir o HBN-100, mas a Sud Aviation também tinha um projeto com tamanho e conceito semelhante, o Galion.



Encerrar

Gerenciamento das Aquisições

É o processo de finalizar todas as aquisições do projeto, aborda cada contrato aplicável ao projeto, ou uma fase do projeto.

O principal benefício deste processo é a documentação dos acordos e outros documentos relacionados, para consultas futuras.




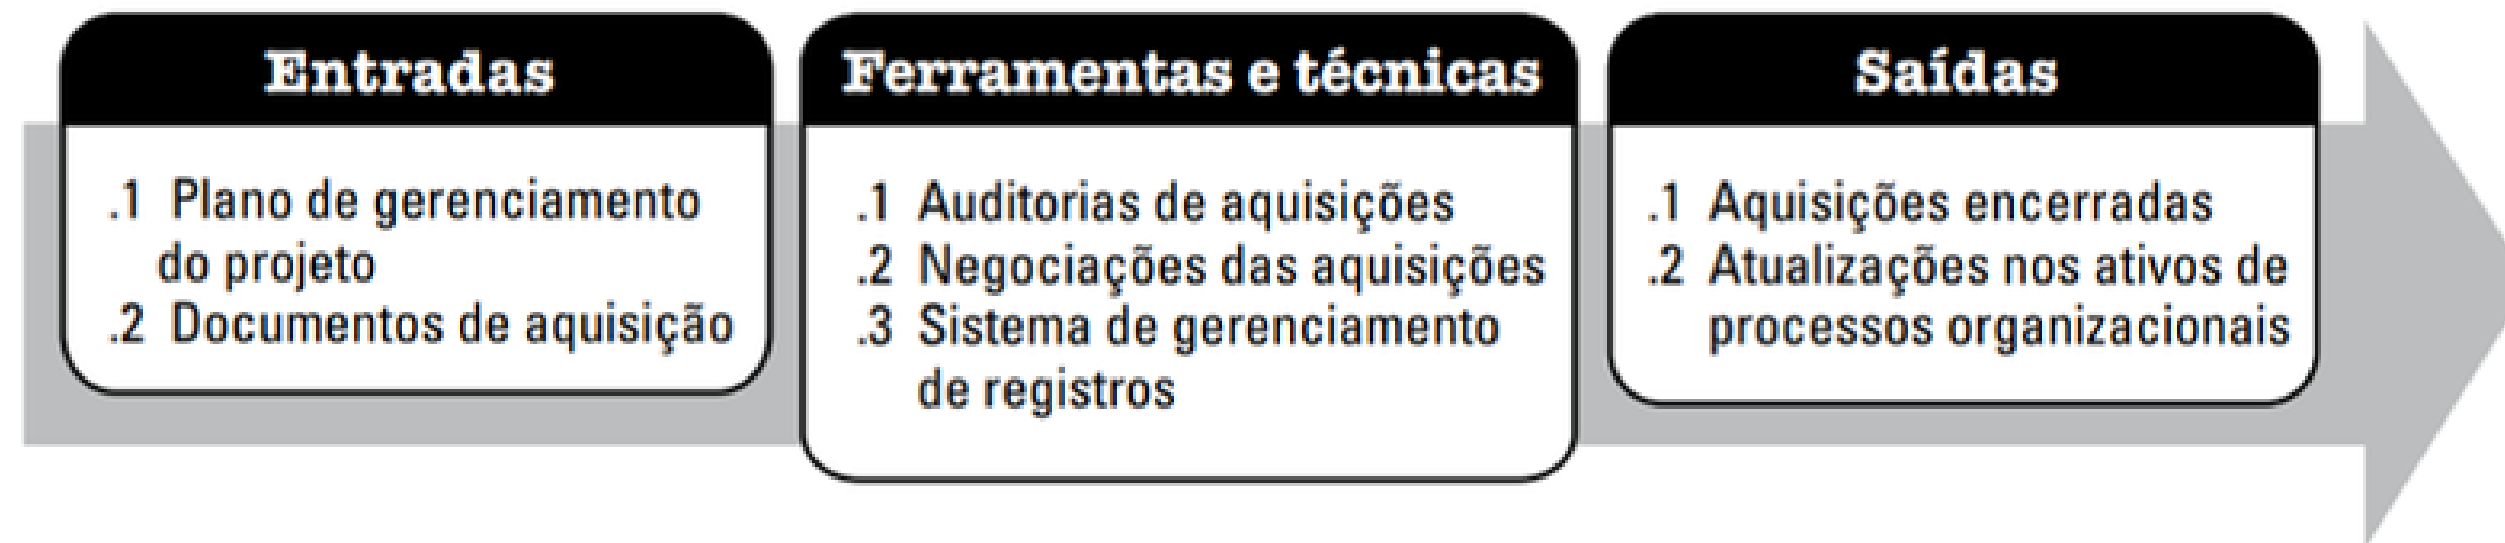


Fig. 8: encerrar as aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas.





Espanha

Países Baixos

França

Alemanha

Reino Unido

ESTABILIZADORES

SUPERFÍCIES
MÓVEIS

CABINE DE
COMANDO

FUSELAGEM

ASAS

SEÇÃO TRASEIRA
DA FUSELAGEM

DISPOSITIVOS
HIPERSUSTENTADORES

AVIÔNICA

EMPENAGEM

CAUDA


SISTEMA
HIDRÁULICO

CONTROLES
DE VOO

AIRBUS

Conclusão

- Importância da seleção adequada de fornecedores;
 - Maximização do valor para o projeto;
 - Gestão de contratos eficaz;
 - Riscos e desafios;
- Colaboração e relacionamento com fornecedores.



*Isso é tudo,
pessoal!*
